

Documentação de Iniciação — PROJ-2026-005

Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender

Gerado por: Diana Documento | Data: 2026-05-15 | Versão: 1.0

DOCUMENTO 1 — TAP: Termo de Abertura do Projeto

1. Identificação do Projeto

Campo	Conteúdo
Código	PROJ-2026-005
Demanda Origem	DEM-2026-002
Título	Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender
Data de Abertura	2026-05-15
Versão do TAP	1.0
Elaborado por	Marcelo Silveira (GP VMO Autônomo)
Solicitante	Sandro Siqueira — Coordenador de Contabilidade, Divisão Comércio, Gr
Sponsor Executivo	**■ A IDENTIFICAR — CONDIÇÃO BLOQUEANTE CB-01 (prazo: 25/05/2026)
Gestor do Projeto	A definir — VMO Autônomo
Cliente / Área	Divisão Comércio — Grupo Águia Branca
Áreas Impactadas	Contabilidade, Financeiro, Jurídico

■ ALERTA: CONDIÇÕES BLOQUEANTES — APROVAÇÃO CONDICIONAL

Este projeto foi aprovado com **SCORE 18/30 (60%)** — **APROVADO COM CONDIÇÕES**.
A execução do projeto está **BLOQUEADA** até que as condições abaixo sejam cumpridas.
O não cumprimento dentro dos prazos estabelecidos implicará em **suspensão automática da abertura formal**.

Código	Condição Bloqueante	Responsável	Prazo	Status
CB-01	Sponsor executivo não identificado	Sandro Siqueira — Divisão Comércio	25/05/2026	■ A DEFINIR
CB-02	Documentação contratual não concluída	Marcelo Silveira — VMO Autônomo	30/05/2026	■ A DEFINIR

2. Objetivo SMART

Substituir **100% das funcionalidades operacionais do Fiscal Defender** pelo módulo nativo **Auditor Fiscal NBS** no ambiente ERP da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, alcançando o **go-live até novembro de 2026** (prazo estimado: 6–8 meses a partir da abertura formal), confirmando a

eliminação do contrato Fiscal Defender e gerando saving recorrente de R\$ 78.000/ano, com custo de implementação residual máximo de R\$ 35.000, garantindo que todas as equipes de Contabilidade, Financeiro e Jurídico operem sem alteração do fluxo de trabalho atual.

Critério SMART	Conteúdo
Specific	Substituição do Fiscal Defender pelo módulo Auditor Fiscal nativo NBS; e
Measurable	100% das funcionalidades do Fiscal Defender replicadas; saving de R\$78.000/ano
Achievable	Desenvolvimento como contrapartida contratual NBS (custo zero); estruturação
Relevant	Alinhamento estratégico com consolidação da plataforma ERP corporativa
Time-bound	Go-live: estimado entre setembro e novembro de 2026

3. Justificativa do Projeto

3.1 Contexto e Motivação

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca utiliza o sistema **Fiscal Defender** para auditoria automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), pagando **R\$ 78.000 por ano** por esse serviço. O fornecedor do ERP corporativo, **NBS**, comprometeu-se contratualmente a desenvolver o módulo **Auditor Fiscal** como contrapartida — sem custo adicional de desenvolvimento.

A não aprovação e execução deste projeto representa:

- **Desperdício financeiro:** continuidade de gasto anual de R\$ 78.000 em solução externa quando a funcionalidade equivalente estará disponível nativamente.
- **Risco de compliance:** dependência de dois sistemas distintos para auditoria fiscal, com potencial de divergência de dados e lacunas de rastreabilidade.
- **Oportunidade perdida:** o comprometimento contratual da NBS tem prazo e escopo definidos — atrasar o projeto pode comprometer os termos acordados.

3.2 ROI e Viabilidade Financeira

Indicador	Valor
Custo anual atual (Fiscal Defender)	R\$ 78.000/ano
Custo de desenvolvimento	R\$ 0 (contrapartida NBS)
Custo residual estimado	~R\$ 35.000 (implementação, treinamento, rescisão)
Orçamento total do projeto	**~R\$ 35.000**
Saving anual recorrente	R\$ 78.000/ano
Payback estimado	**~5,4 meses**
ROI no 1º ano completo	> 100%

3.3 Alinhamento Estratégico

- Consolidação da plataforma ERP NBS como solução única de gestão corporativa.
- Redução de fornecedores e dependências externas.

- Eficiência operacional: integração nativa elimina exportações/importações manuais de dados entre sistemas.

4. Escopo do Projeto

4.1 Dentro do Escopo (IN SCOPE)

- Implantação do módulo Auditor Fiscal NBS na Divisão Comércio.
- Configuração e parametrização do módulo conforme regras fiscais da Divisão Comércio.
- Replicação de todas as funcionalidades operacionais do Fiscal Defender (RF-01 a RF-08).
- Testes de homologação e validação com equipes de Contabilidade, Financeiro e Jurídico.
- Treinamento das equipes usuárias.
- Encerramento formal do contrato Fiscal Defender.
- Gestão da transição (período de operação paralela se necessário).

4.2 Fora do Escopo (OUT OF SCOPE)

- Desenvolvimento de novas funcionalidades além das previstas nos RF-01 a RF-08 (salvo aprovação formal de mudança).
- Implantação em outras divisões do Grupo Águia Branca.
- Integração com Power BI (a ser avaliada como demanda futura — não confirmada para este projeto).
- Migração de dados históricos do Fiscal Defender (necessidade não avaliada — a ser definida na fase de planejamento detalhado).
- Alteração dos processos operacionais das equipes (RF-07: manutenção do fluxo atual).
- Customizações no núcleo do ERP NBS não relacionadas ao módulo Auditor Fiscal.

5. Estimativas de Custo e Prazo

5.1 Orçamento

Categoria	Estimativa	Observação
Desenvolvimento do módulo (NBS)	R\$ 0	Contrapartida contratual — **SUJEITO A CB-02**
Implementação / configuração / parametrização	R\$ 15.000	Horas de consultoria NBS ou interna
Treinamento das equipes	~R\$ 8.000	Estimativa preliminar
Rescisão contratual Fiscal Defender	~R\$ 7.000	Multas e aviso prévio (verificar contrato)
Contingência (reserva gerencial ~15%)	~R\$ 5.000	Sobre custos residuais
Total Estimado	**~R\$ 35.000**	Revisão obrigatória após CB-02 resolvida

5.2 Cronograma Estimado

Prazo estimado com base em projetos similares de implantação de módulo ERP. Cronograma detalhado a ser elaborado na fase de planejamento.

Fase	Duração Estimada	Período Provável
Iniciação e resolução de condições bloqueadas	2 semanas	mai/2026
Planejamento detalhado	3 semanas	jun/2026
Implantação e configuração (NBS)	8 semanas	jul–ago/2026
Testes e homologação	4 semanas	set/2026
Treinamento e transição	3 semanas	out/2026
Go-live e encerramento Fiscal Defender	2 semanas	out–nov/2026
Go-live estimado	—	**Outubro/Novembro 2026**
Duração total estimada	**~6–7 meses**	mai–nov/2026

6. Premissas

Código	Premissa	Status
P-01	O acordo contratual NBS para desenvolvimento do módulo Auditor Fiscal Defender será formalizado e vigente.	**Em Confirmação**
P-02	A NBS entregará o módulo Auditor Fiscal Defender para a Divisão Comércio e Comércio Exterior.	**Em Confirmação**
P-03	Um sponsor executivo da Divisão Comércio e Comércio Exterior será nomeado e comprometido até 25/05/2026.	**Em Confirmação**
P-04	As equipes de Contabilidade, Financeiro e TI disponibilizarão representantes para participar do desenvolvimento do módulo.	**Em Confirmação**
P-05	O módulo Auditor Fiscal NBS será compatível com a versão do ERP atualmente implantada na NBS.	**Em Confirmação**
P-06	O contrato com o Fiscal Defender permite rescisão dentro do prazo do projeto.	**Em Confirmação**
P-07	Não haverá necessidade de migração de dados históricos do Fiscal Defender (ou, se necessário, a migração será realizada).	**Em Confirmação**

7. Restrições

Código	Restrição
R-01	O orçamento máximo de custos residuais é de **R\$ 35.000** . Qualquer exatidão deve ser aprovada pelo Comitê de Governança.
R-02	O fluxo operacional das equipes não pode ser alterado (RF-07) — a solução deve ser desenvolvida e implantada sem afetar o fluxo operacional.
R-03	O go-live deve ocorrer dentro do exercício fiscal de 2026 para viabilizar a entrega do projeto.
R-04	O desenvolvimento do módulo é de responsabilidade exclusiva da NBS — a NBS não pode ser responsabilizada por falhas ou atrasos no desenvolvimento.
R-05	A rescisão do Fiscal Defender só pode ocorrer após validação completa do projeto.

8. Critérios de Sucesso

#	Critério Mensurável
CS-01	**100% dos requisitos funcionais** (RF-01 a RF-08) validados e aprovados pelo Comitê de Governança.

#	Critério Mensurável
CS-02	**Contrato Fiscal Defender encerrado** até o go-live, com **saving de R\$ 35.000** em custos residuais, sem necessidade de recursos adicionais
CS-03	**Custo total do projeto ≤ R\$ 35.000** (custos residuais), sem necessidade de recursos adicionais
CS-04	**Zero incidentes críticos** de auditoria fiscal não detectados no primeiro mês de operação
CS-05	**Satisfação dos usuários ≥ 80%** em pesquisa aplicada 30 dias após o go-live

9. Partes Interessadas (Stakeholders)

Papel	Nome / Área	Influência	Interesse	Observação
Solicitante / Patrocinador	Marcelo Silveira — Coord. Contabilidade, Div. Comércio	Alta	Alto	Ponto focal da demanda
Sponsor Executivo	**A IDENTIFICAR — CB-01**	**Alta**	**Alto**	**■ Condição Bloqueante**
Gestor do Projeto	A designar — VMO Autônomo	Alto	Alto	—
Fornecedor (desenvolvimento)	NBS — Fornecedor ERP	Alta	Médio	Responsável pelo desenvolvimento do sistema
Área de Contabilidade	Divisão Comércio	Média	Alto	Usuária principal
Área Financeiro	Divisão Comércio	Média	Alto	Usuária impactada
Área Jurídico	Divisão Comércio	Média	Médio	Usuária impactada
TI / Infraestrutura	Grupo Águia Branca	Média	Médio	Suporte técnico e ambiente
Aprovador VMO	Marcelo Silveira — GP VMO Autônomo	Alto	Alto	Aprovação e acompanhamento do projeto

10. Riscos Iniciais Identificados

Código	Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Resposta Preliminar
RSK-01	**Sponsor executivo não identificado até 25/05/2026 (CB-01)**	**Alto**	**Crítico**	**CRÍTICO**	Bloquear abertura formal; escalar para a diretoria
RSK-02	**Compromisso com NBS não verificado/inexistente (CB-02)**	**Alto**	**Crítico**	**CRÍTICO**	Bloquear abertura formal; acionar a diretoria
RSK-03	NBS atrasar ou não entregar o módulo dentro do prazo acordado	Média	Alto	Alto	Definir SLA contratual; acompanhar de perto
RSK-04	Módulo Auditor Fiscal com funcionalidades não completas em relação ao Fiscal Defender	Média	Médio	Média	Monitorar de rastreabilidade de requisitos
RSK-05	Custo de rescisão do Fiscal Defender superior ao estimado	Baixa	Médio	Baixa	Revisão antecipada do contrato Fisco
RSK-06	Necessidade de migração de dados históricos não prevista	Média	Médio	Média	Levantar necessidade na fase de planejamento
RSK-07	Resistência das equipes à mudança de processo	Baixa	Baixa	Baixa	Plano de comunicação e treinamento

11. Aprovação do TAP

Papel	Nome	Assinatura / Validação	Data
Gestor do Projeto (VMO)	Marcelo Silveira	Aprovado	2026-05-15

Papel	Nome	Assinatura / Validação	Data
Solicitante	Sandro Siqueira	■ Pendente	—
Sponsor Executivo	**A IDENTIFICAR**	**■ BLOQUEADO — CB-01**	—

NOTA: A abertura formal do projeto fica condicionada à resolução das condições CB-01 e CB-02 até os respectivos prazos. Em caso de não cumprimento, o projeto será suspenso para reavaliação.

DOCUMENTO 2 — PM CANVAS

PROJ-2026-005 | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

BLOCO 1 — JUSTIFICATIVA

Por que este projeto existe?

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca desembolsa **R\$ 78.000/ano** com o Fiscal Defender para auditoria de NF-e. O fornecedor NBS comprometeu-se contratualmente a entregar o módulo **Auditor Fiscal** nativo ao ERP como contrapartida, sem custo de desenvolvimento. Manter o contrato externo representa desperdício financeiro direto e fragmentação do ecossistema tecnológico.

Drivers:

- Saving financeiro imediato: R\$ 78.000/ano (payback ~5,4 meses sobre R\$ 35K residuais)
- Consolidação tecnológica: redução de fornecedores e integração nativa
- Compliance fiscal: eliminação de lacunas entre sistemas distintos

BLOCO 2 — OBJETIVO SMART

Substituir **100% das funcionalidades operacionais do Fiscal Defender** pelo módulo nativo **Auditor Fiscal NBS** na Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, com **go-live até novembro de 2026**, dentro do orçamento de **R\$ 35.000** em custos residuais, confirmando o encerramento do contrato Fiscal Defender e o **saving recorrente de R\$ 78.000/ano**.

BLOCO 3 — BENEFÍCIOS

Tipo	Benefício	Indicador
Financeiro	Eliminar custo anual de R\$ 78.000 com o Fiscal Defender	Fiscal Defender encerrado
Financeiro	ROI > 100% no primeiro ano completo após go-live	Retorno financeiro pós-projeto
Operacional	Integração nativa NF-e via ERP — sem necessidade de integração	Zero interfaces entre sistemas
Operacional	Deteção de fraudes e pagamentos indevidos diretamente no ERP	Alertas de pagamentos no ERP
Estratégico	Consolidação da plataforma ERP NBS com redução de fornecedores	Redução de fornecedores externos
Qualidade	Usabilidade superior ao Fiscal Defender (R50B)	Índice de satisfação ≥ 80%

BLOCO 4 — PRODUTO

O que será entregue?

Módulo **Auditor Fiscal** implantado, configurado e em produção no ERP NBS da Divisão Comércio, com as seguintes capacidades operacionais:

- Importação e processamento automático de NF-e a partir da base ERP
- Motor de auditoria automatizada de notas fiscais
- Alertas de fraude, risco de multa e pagamentos indevidos
- Relatórios operacionais e gerenciais de auditoria fiscal
- Interface compatível com o fluxo operacional atual das equipes
- Usabilidade igual ou superior ao Fiscal Defender

Entregáveis do Projeto:

1. Módulo Auditor Fiscal configurado e homologado
2. Documentação técnica e manual do usuário
3. Treinamento aplicado às equipes (Contabilidade, Financeiro, Jurídico)
4. Relatório de encerramento com confirmação do saving

BLOCO 5 — REQUISITOS

Código	Requisito	Área
RF-01	Importar e processar NF-e a partir da base ERP	Contabilidade
RF-02	Realizar auditoria automatizada das notas fiscais	Contabilidade
RF-03	Identificar e alertar sobre possíveis fraudes	Contabilidade / Jurídico
RF-04	Identificar e alertar sobre riscos de multa	Contabilidade / Jurídico
RF-05	Identificar e alertar sobre pagamentos indevidos	Financeiro
RF-06	Gerar relatórios operacionais e gerenciais de auditoria fiscal	Contabilidade / Gerência
RF-07	Manter o fluxo operacional atual das equipes (sem alteração de processo)	Equipes
RF-08	Oferecer funcionalidades de usabilidade superiores ao Fiscal Defender	Equipes

Requisitos pendentes de levantamento:

- Necessidade de migração de dados históricos
- Integração com Power BI (possível, não confirmada)
- Requisitos específicos de Financeiro e Jurídico

BLOCO 6 — STAKEHOLDERS

Stakeholder	Papel	Nível de Engajamento Esperado
Sandro Siqueira (Coord. Contabilidade)	Solicitante / Ponto Focal	Alto — participação ativa
A IDENTIFICAR	**Sponsor Executivo — CB-01**	**■ BLOQUEANTE**
NBS (Fornecedor ERP)	Executor do desenvolvimento	Alto — entrega do módulo

Stakeholder	Papel	Nível de Engajamento Esperado
Equipe Contabilidade — Div. Comércio	Usuária principal	Alto — testes e homologação
Equipe Financeiro — Div. Comércio	Usuária impactada	Médio — validação de RF-05/06
Equipe Jurídico — Div. Comércio	Usuária impactada	Médio — validação de RF-03/04
TI / Infraestrutura — Grupo Água Branca	Suporte técnico	Médio — ambiente e acesso
Marcelo Silveira (GP VMO)	Gestor do Projeto	Alto — aprovação e acompanhamento

BLOCO 7 — PREMISSAS

Código	Premissa	Status
P-01	Acordo contratual NBS para Auditor Fiscal de 2026	■ CONFIRMAR — vigente
P-02	Sponsor executivo da Divisão Comércio	■ CONFIRMAR — 25/05/2026
P-03	NBS desenvolve o módulo sem custo adicional para o cliente	■ CONFIRMAR
P-04	Equipes disponibilizarão representantes para testes e homologação	■ CONFIRMAR
P-05	Módulo compatível com versão ERP atual da Divisão Comércio	■ CONFIRMAR
P-06	Rescisão do Fiscal Defender viável dentro do prazo do projeto	■ CONFIRMAR

BLOCO 8 — RESTRIÇÕES

Código	Restrição
R-01	Orçamento máximo de custos residuais: **R\$ 35.000**
R-02	Fluxo operacional das equipes não pode ser alterado (RF-07)
R-03	Go-live dentro do exercício fiscal de 2026
R-04	Desenvolvimento do módulo é responsabilidade exclusiva da NBS
R-05	Rescisão do Fiscal Defender somente após validação completa em produção

BLOCO 9 — RISCOS

■ **ATENÇÃO: Dois riscos críticos (condições bloqueantes) impedem a abertura formal do projeto.**

Código	Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Ação
RSK-01	**Sponsor executivo não identificado — CB-01**	Alto	Alto	**CRÍTICO**	Escalar imediatamente; prazo: 25/05/2026
RSK-02	**Compromisso NBS não verificado/inexistente — CB-02**	Alto	Alto	**CRÍTICO**	Acionar Jurídico; prazo: 30/05/2026
RSK-03	NBS atrasar entrega do módulo	Média	Alto	Alta	SLA contratual; acompanhamento
RSK-04	Funcionalidades do Módulo incompletas no Fiscal Defender	Média	Médio	Média	Matriz de rastreabilidade; testes
RSK-05	Necessidade de migração de dados históricos não prevista	Média	Médio	Média	Levantamento na fase de planejamento

Código	Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Ação
RSK-06	Custo rescisão Fiscal Defender	Alto	Médio	Baixa	Revisar contrato Fiscal Defender

DOCUMENTO 3 — PLANO GERAL DO PROJETO

PROJ-2026-005 | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-15 | Status: Rascunho — sujeito a revisão após resolução das condições bloqueantes CB-01 e CB-02

■ **NOTA IMPORTANTE:** Este Plano Geral é preliminar. O detalhamento de cada plano subsidiário deve ser desenvolvido após a abertura formal do projeto, condicionada à resolução de CB-01 (sponsor executivo) e CB-02 (verificação contratual NBS).

1. Plano de Gerenciamento do Escopo

Objetivo: Definir, documentar e controlar o que está dentro e fora do escopo do projeto, prevenindo scope creep.

Abordagem:

- O escopo foi definido inicialmente no TAP (seção 4) e será detalhado na fase de planejamento.
- A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) será elaborada com base nos 8 requisitos funcionais (RF-01 a RF-08) e nos entregáveis identificados.
- Qualquer alteração de escopo seguirá o processo formal do Plano de Gerenciamento de Mudanças.

Itens pendentes de levantamento (fora do escopo atual, a avaliar):

- Migração de dados históricos do Fiscal Defender
- Integração com Power BI
- Impactos detalhados em Financeiro e Jurídico

Ferramentas: EAP, Dicionário da EAP, Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.

Processo de controle:

- Reunião de revisão de escopo a cada fase do projeto
- Solicitações de mudança de escopo submetidas ao Comitê de Mudanças (sponsor + GP)

2. Plano de Gerenciamento do Cronograma

Objetivo: Planejar, sequenciar e controlar as atividades para garantir o go-live dentro do prazo estimado.

Cronograma macro:

Fase	Início Previsto	Término Previsto	Duração
Fase 0 — Resolução de condições bloqueantes	2026-05-15	2026-05-30	~2 semanas
Fase 1 — Iniciação formal	2026-06-02	2026-06-13	~2 semanas

Fase	Início Previsto	Término Previsto	Duração
Fase 2 — Planejamento detalhado	2026-06-16	2026-07-04	~3 semanas
Fase 3 — Implantação e configuração (NBS)	2026-07-05	2026-08-29	~8 semanas
Fase 4 — Testes e homologação	2026-09-01	2026-09-26	~4 semanas
Fase 5 — Treinamento e transição	2026-09-29	2026-10-17	~3 semanas
Fase 6 — Go-live e encerramento	2026-10-20	2026-11-07	~2,5 semanas
Go-live estimado	**out/nov 2026**	—	—

Marcos críticos (milestones):

Marco	Descrição	Data Prevista
M-01	■ CB-01 resolvido (sponsor identificado)	25/05/2026
M-02	■ CB-02 resolvido (contrato NBS verificado)	30/05/2026
M-03	TAP assinado — abertura formal do projeto	jun/2026
M-04	Planejamento detalhado aprovado	jul/2026
M-05	Módulo entregue pela NBS (ambiente de testes)	ago/2026
M-06	Homologação concluída e aprovada	set/2026
M-07	Treinamento concluído	out/2026
M-08	**Go-live em produção**	**out/nov 2026**
M-09	Encerramento do contrato Fiscal Defender	nov/2026

Controle: Relatório de progresso quinzenal; reunião de acompanhamento mensal com sponsor.

3. Plano de Gerenciamento de Custos

Objetivo: Estimar, orçar e controlar os custos residuais do projeto dentro do limite de R\$ 35.000.

Orçamento detalhado:

Categoria	Estimativa Inicial	Reserva Gerencial (~15%)	Total
Desenvolvimento NBS	R\$ 0	—	R\$ 0
Implementação e parametrização	R\$ 15.000	R\$ 2.250	R\$ 17.250
Treinamento das equipes	R\$ 8.000	R\$ 1.200	R\$ 9.200
Rescisão contratual Fiscal Defender	R\$ 10.000	R\$ 1.050	R\$ 8.050
Gestão de projeto (VMO)	R\$ 0	—	R\$ 0
Total	**R\$ 30.000**	**R\$ 4.500**	**~R\$ 35.000**

Nota: Os valores de implementação, treinamento e rescisão são estimativas preliminares a serem refinadas na fase de planejamento, após verificação do contrato Fiscal Defender (CB-02) e definição do modelo de implantação com a NBS.

Controle: Relatório de custos mensais; alerta ao sponsor quando 80% do orçamento for comprometido; qualquer extrapolação requer aprovação formal.

4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Objetivo: Garantir que o módulo Auditor Fiscal atenda a todos os requisitos funcionais e de usabilidade antes do go-live.

Padrões de qualidade:

- 100% dos RF-01 a RF-08 testados e aprovados pelas áreas usuárias.
- Zero regressão nas funcionalidades do Fiscal Defender (auditoria comparativa).
- Satisfação dos usuários $\geq 80\%$ em pesquisa 30 dias pós go-live.
- Zero incidentes críticos de auditoria fiscal não detectados no primeiro trimestre pós go-live.

Atividades de qualidade:

Atividade	Responsável	Quando
Revisão da matriz de requisitos	GP + Sandro Siqueira	Fase de planejamento
Plano de testes de homologação	GP + NBS + Equipe Contabilidade	Fase 3
Testes de aceitação do usuário (UAT)	Equipes de Contabilidade, Financeiro, Jurídico	Fase 4
Auditoria comparativa Fiscal Defender x Auditor Fiscal	Equipe Fiscal	Fase 4
Pesquisa de satisfação pós go-live	GP VMO	30 dias pós go-live

5. Plano de Gerenciamento de Recursos

Objetivo: Identificar, alocar e gerenciar os recursos humanos e materiais necessários ao projeto.

Equipe do projeto:

Papel	Recurso	Dedicação Estimada
Gestor do Projeto	VMO Autônomo (a designar)	Parcial (~20% do tempo)
Ponto Focal do Cliente	Sandro Siqueira	Parcial (~10% do tempo)
Sponsor Executivo	**A IDENTIFICAR — CB-01**	**■ Pendente**
Consultor Técnico NBS	Equipe NBS (fornecedor)	A definir com NBS
Representante Contabilidade	A indicar por Sandro Siqueira	Parcial — fases 4 e 5
Representante Financeiro	A indicar	Parcial — fase 4
Representante Jurídico	A indicar	Parcial — fase 4
TI / Infraestrutura	Equipe TI Grupo Água Branca	Pontual

Recursos materiais: Ambiente ERP NBS (desenvolvimento, homologação, produção) — provido pela infraestrutura existente.

6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

Objetivo: Garantir que as informações certas cheguem às pessoas certas no momento adequado.

Matriz de comunicações:

Comunicação	Conteúdo	Frequência	Formato	Responsável	Destinatários
Relatório de status do projeto	Progresso, custos, riscos e próximos passos	Semanal	E-mail / PDF	GP VMO	Sponsor, Sandro Siqueira
Reunião de acompanhamento	Status de decisões, impedimentos	Mensal	Videoconferência	GP VMO	Sponsor, Sandro Siqueira, NBS
Ata de reunião	Decisões e ações acordadas	Por ocasião	Documento	GP VMO	Todos participantes
Alerta de risco / impedimento	Riscos críticos ou bloqueios identificados	Sob demanda	E-mail urgente	GP VMO	Sponsor, Sandro Siqueira
Comunicado de go-live	Confirmação da entrada em produção	Única	E-mail / Comunicado	GP VMO	Toda a Divisão Comércio
Pesquisa de satisfação	Avaliação das equipes (30 dias pós)	Semanal	Formulário	GP VMO	Contabilidade, Financeiro, Jurídico

Canal principal: E-mail corporativo + ferramenta de gestão de projetos VMO.

7. Plano de Gerenciamento de Riscos

Objetivo: Identificar, analisar, priorizar e responder aos riscos do projeto de forma proativa.

Metodologia: Análise qualitativa de riscos (probabilidade × impacto) com revisão mensal.

Registro de riscos:

Código	Risco	Prob.	Impacto	Prioridade	Estratégia	Ação de Resposta	Status
RSK-01	**Sponsor não identificado (CB-01)**	Alta	Alta	**CRÍTICO**	Escalar	Acionar alta gestão	Sandro Siqueira
RSK-02	**Compromisso NBS não verificado (CB-02)**	Alta	Alta	**CRÍTICO**	Verificar	Acionar Jurídico	Sandro Siqueira
RSK-03	Atraso na entrega do módulo	Média	Alta	Alta	Mitigar	Definir SLA; cláusula de penalidade no contrato	GP VMO
RSK-04	Módulo com funcionalidades incompletas	Média	Média	Média	Mitigar	Matriz de rastreio de requisitos; testes	GP VMO
RSK-05	Migração de dados históricos necessária (não prevista)	Média	Média	Média	Aceitar/Mitigar	Levantar necessidade no planejamento; negociar	GP VMO
RSK-06	Custo de rescisão Fiscal Defender Médio estimado	Baixa	Baixa	Baixa	Mitigar	Revisar contrato Fiscal Defender na fase de planejamento	GP VMO
RSK-07	Resistência das equipes à nova ferramenta	Baixa	Baixa	Baixa	Mitigar	Plano de comunicação e treinamento	GP VMO

Frequência de revisão: Mensal (reunião de acompanhamento) e sob demanda para riscos críticos.

8. Plano de Gerenciamento de Aquisições

Objetivo: Gerenciar a relação com fornecedores e aquisições necessárias ao projeto.

Fornecedores identificados:

Fornecedor	Objeto	Tipo de Contrato	Status
NBS	Desenvolvimento do módulo	Contrato atual a ser rescindido	A VERIFICAR — CB-02**
Fiscal Defender	Contrato atual a ser rescindido	Rescisão	Verificar cláusulas e multas
NBS (serviços)	Implementação, parametrização	Ordem de Serviço / SOW	A negociar na fase de planejamento

Ações prioritárias de aquisição:

1. **CB-02:** Verificar e formalizar o compromisso NBS em relação ao Auditor Fiscal.
2. Revisar contrato Fiscal Defender para entender condições e custos de rescisão.
3. Elaborar Declaração de Trabalho (SOW) para os serviços de implementação e treinamento NBS.
4. Formalizar Ordem de Serviço com NBS para as fases de implantação.

Critérios de encerramento de aquisições:

- Módulo entregue, homologado e em produção.
- Contrato Fiscal Defender encerrado sem pendências.

9. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

Objetivo: Engajar as partes interessadas de forma adequada ao longo do projeto, garantindo suporte e reduzindo resistências.

Análise de engajamento:

Stakeholder	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégia de Engajamento
Sandro Siqueira	Engajado	Engajado	Manter comunicação frequente; incluir nas
Sponsor Executivo (CB-01)	*Desconhecido**	**Liderando**	**Identificar e engajar como prioridade máx
NBS	Comprometido	Comprometido	Formalizar compromissos via contrato; reu
Equipe Contabilidade	Neutro	Apoiador	Envolver cedo nos requisitos; comunicar be
Equipe Financeiro	Neutro	Apoiador	Mapear impactos específicos; incluir nos te
Equipe Jurídico	Neutro	Apoiador	Mapear impactos em RF-03/04; incluir nos
TI / Infraestrutura	Neutro	Apoiador	Envolver desde o início para ambiente e int

Ações prioritárias:


1. Identificar e engajar o Sponsor Executivo até 25/05/2026 (CB-01).
2. Realizar reunião de kick-off com todas as áreas após abertura formal.
3. Comunicar claramente os benefícios e o impacto mínimo no fluxo operacional (RF-07).


10. Plano de Gerenciamento de Mudanças

Objetivo: Controlar formalmente qualquer alteração no escopo, prazo, custo ou qualidade do projeto.

Processo de Controle de Mudanças:

Solicitação de Mudança

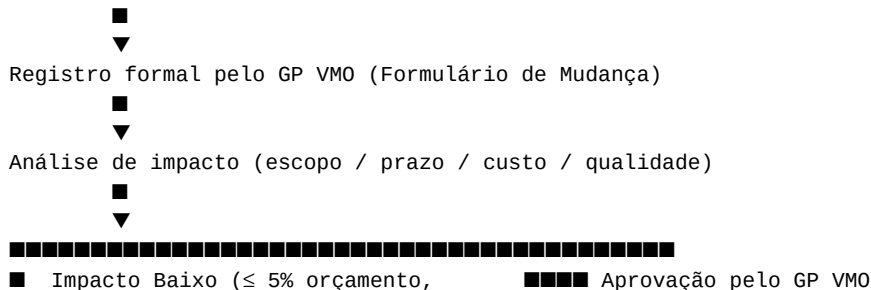

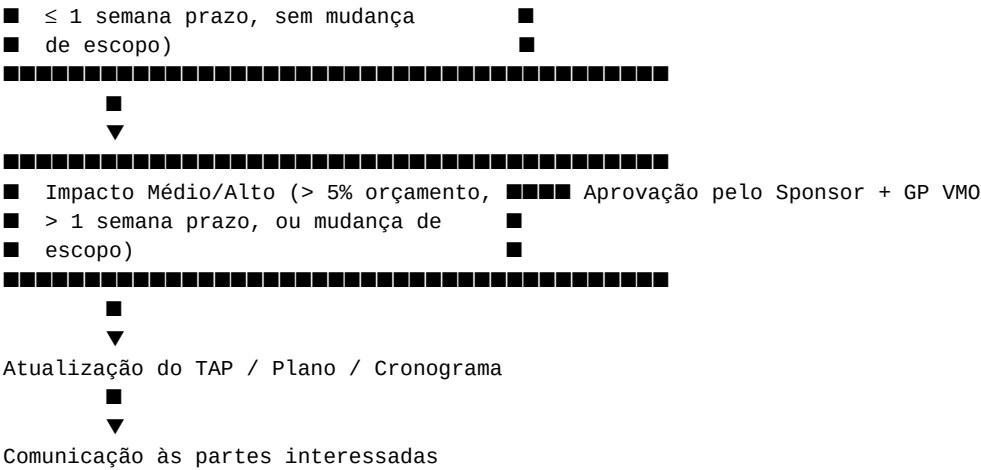

Categorias de mudança e alçadas:

Categoria	Critério	Alçada de Aprovação
Baixo impacto	Até 5% do orçamento ou 1 semana no prazo	Gestor do Projeto (VMO)
Médio impacto	5–15% do orçamento ou 2–4 semanas no prazo	Sponsor + GP VMO
Alto impacto	> 15% do orçamento ou > 1 mês no prazo	Sponsor + GP VMO + Comitê de Aprovação

Registro: Todas as mudanças aprovadas ou rejeitadas serão registradas no Log de Mudanças do projeto.

Mudanças proibidas sem aprovação formal do sponsor:

- Inclusão de novas áreas além da Divisão Comércio.
- Qualquer alteração que comprometa o go-live em 2026.
- Custos que ultrapassem o orçamento aprovado de R\$ 35.000.

Aprovação do Plano Geral

Papel	Nome	Status	Data
Gestor do Projeto (VMO)	Marcelo Silveira	Aprovado	2026-05-15
Solicitante	Sandro Siqueira	■ Pendente	—
Sponsor Executivo	**A IDENTIFICAR**	**■ BLOQUEADO — CB-01**	—
